



Università di Padova



sweasabi@gmail.com

Corso di Ingegneria del Software A.A.:2022/2023

# Verbale *Sprint 2*

dal 13 nov 2022 al 19 nov 2022

<b>Approvazione</b>	Peron Samuel
<b>Segreteria</b>	Peron Samuel Massarenti Alessandro
<b>Verifica</b>	Massarenti Alessandro
<b>Uso</b>	Interno Esterno
<b>Destinatario</b>	<i>Il gruppo</i> Committente

## Indice

<b>1</b>	<b>Ruoli</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Preventivo</b>	<b>2</b>
2.1	Milestones: . . . . .	2
2.1.1	Requirements and technology baseline . . . . .	2
<b>3</b>	<b>Consuntivazione</b>	<b>2</b>
3.1	Milestones: . . . . .	2
3.2	Attività svolte . . . . .	2
3.3	Difficoltà e problemi di sprint . . . . .	3

# 1 Ruoli

I ruoli in questo sprint sono rimasti i medesimi dello sprint precedente.

I ruoli principali:

Nominativo	Ruolo
Bonavigo Michele	Analista
Casarotto Mattia	Analista
Massarenti Alessandro	Verificatore
Peron Samuel	Responsabile
Pierobon Luca	Amministratore
Romano Davide	Analista
Zarantonello Giorgio	Analista

## 2 Preventivo

In questo sprint abbiamo preventivato di riordinare e ripulire quanto compiuto nello sprint precedente.

### 2.1 Milestones:

#### 2.1.1 Requirements and technology baseline

È la principale milestone che rimarrà attiva durante molteplici sprint.

Questa milestone è registrata qui

## 3 Consuntivazione

### 3.1 Milestones:

- Analisi dei requisiti v1.0.0 (Completa al: 50%)
- Requirements and technology baseline (Completa al: 30%)


### 3.2 Attività svolte

Attività	Stato	Ruolo
creazione di un ambiente <i>github pages</i>	completato	Amministratore

Tabella 1: Lista delle attività svolte durante lo sprint

	Re	Amm	An	Pro	Prog	Ver	tot
Bonavigo Michele	0	0	0	0	0	0	0
Casarotto Mattia	0	0	0	0	0	0	0
Massarenti Alessandro	0	0	0	0	0	0	1
Peron Samuel	2,5	0	0	0	0	0	0
Pierobon Luca	0	3	0	0	0	0	0
Romano Davide	0	0	0	0	0	0	0
Zarantonello Giorgio	0	0	0	0	0	0	0
	2,5	3	0	0	0	0	1

Tabella 2: Spartizione dei ruoli e ore svolte durante lo sprint

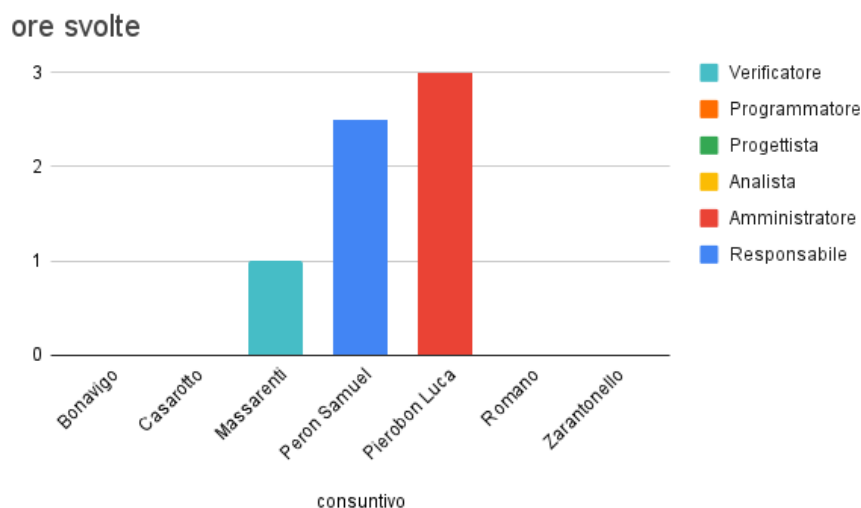

	Ore	Costo
Responsabile	2,5	€ 70,00
Amministratore	3	€ 60,00
Analista	0	€ 0,00
Progettista	0	€ 0,00
Programmatore	0	€ 0,00
Verificatore	1	€ 15,00
totale	6,5	€ 150,00

Tabella 3: Spartizione dei ruoli e ore svolte durante lo sprint

Avendo quindi consumato €150,00<sup>1</sup> del budget durante questo sprint, rimangono ancora a disposizione € 13533,25 per gli sprint seguenti.

### 3.3 Difficoltà e problemi di sprint

Alcune questioni sono risultate durante questo sprint:

- Alcune attività sono più lunghe dello sprint e non sono state spezzate abbastanza.
- Lo sprint potrebbe essere più lungo per evitare problemi di organizzazione.

Queste verranno discusse in sede di preparazione del prossimo sprint.

<sup>1</sup>Si veda tabella 3
