



Università di Padova



sweasabi@gmail.com

Corso di Ingegneria del Software A.A.:2022/2023

# Verbale *Sprint 6*

dal 1 gen 2023 al 14 gen 2023

<b>Approvazione</b>	Bonavigo Michele
<b>Segreteria</b>	Bonavigo Michele Massarenti Alessandro
<b>Verifica</b>	Massarenti Alessandro
<b>Uso</b>	Interno Esterno
<b>Destinatario</b>	<i>Il gruppo</i> Committente

## Indice

<b>1</b>	<b>Ruoli</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Preventivo</b>	<b>2</b>
2.1	Milestones: . . . . .	2
2.1.1	Release versione 0.0.4 dell'analisi dei requisiti . . . . .	2
<b>3</b>	<b>Consuntivazione</b>	<b>2</b>
3.1	Milestones: . . . . .	2
3.2	Attività svolte . . . . .	2
3.3	Trend e riflessioni . . . . .	3
3.4	Difficoltà e problemi di sprint . . . . .	3

# 1 Ruoli

I ruoli in questo sprint sono rimasti gli stessi dello sprint precedente.

**I ruoli principali:**

<b>Nominativo</b>	<b>Ruolo</b>
Bonavigo Michele	Responsabile
Casarotto Mattia	Analista
Massarenti Alessandro	Analista
Peron Samuel	Analista
Pierobon Luca	Verificatore
Romano Davide	Analista
Zarantonello Giorgio	Analista

## 2 Preventivo

In questo sprint abbiamo preventivato di sviluppare il **PoC** e le **Norme di Progetto**.

### 2.1 Milestones:

#### 2.1.1 Release versione 0.0.4 dell'analisi dei requisiti

È la principale milestone di questo sprint.

Questa milestone è registrata qui

## 3 Consuntivazione

### 3.1 Milestones:

- Release versione 0.0.4 dell'analisi dei requisiti (Completa al: 80%)


### 3.2 Attività svolte

<b>Attività</b>	<b>Stato</b>	<b>Ruolo</b>
aggiunti processi primari alle <b>Norme di Progetto</b>	completato	Amministratore
aggiunti processi di supporto alle <b>Norme di Progetto</b>	completato	Amministratore
definite norme di codifica	completato	Amministratore
documentato il <b>PoC</b>	completato	Amministratore
progredito con il <b>PoC</b>	completato	Amministratore

Tabella 1: Lista delle attività svolte durante lo sprint

	Re	Amm	An	Pro	Prog	Ver	tot
Bonavigo Michele	2,4	1,7	0	0	0	0,45	4,55
Casarotto Mattia	0	0	8,9	0	0	0	8,9
Massarenti Alessandro	0,4	5,95	5,75	0	0	1	13,1
Peron Samuel	0	0	0	0	0	0	0
Pierobon Luca	0	0	0,35	0	0	3,9	4,25
Romano Davide	0	0	0	0	0	0	0
Zarantonello Giorgio	0	0	4,5	0	0	0	4,5
	2,8	7,65	19,5	0	0	5,35	

Tabella 2: Spartizione dei ruoli e ore svolte durante lo sprint

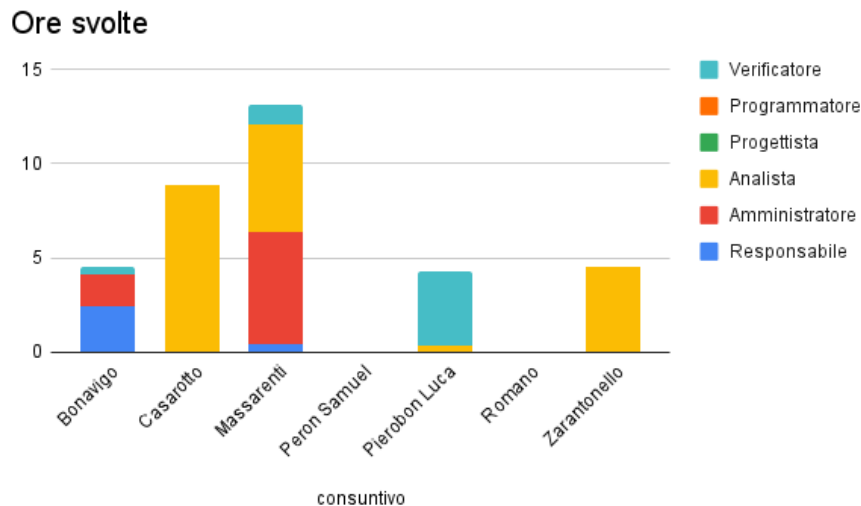

	Ore	Costo
Responsabile	2,8	€ 84,00
Amministratore	7,65	€ 153,00
Analista	19,5	€ 487,50
Progettista	0	€ 0,00
Programmatore	0	€ 0,00
Verificatore	5,35	€ 80,25
totale	35,3	€ 804,75

Tabella 3: Spartizione dei ruoli e ore svolte durante lo sprint

Avendo quindi consumato €804,75<sup>1</sup> del budget durante questo sprint, rimangono ancora a disposizione € 11836,00 per gli sprint seguenti.

### 3.3 Trend e riflessioni

Come preventivato nel verbale SPR\_20230101, ovvero quello precedente, possiamo notare nella figura 1 un trend positivo.

È nostro desiderio mantenere questo ritmo.

### 3.4 Difficoltà e problemi di sprint

Alcune questioni sono risultate durante questo sprint:

<sup>1</sup>Si veda tabella 3

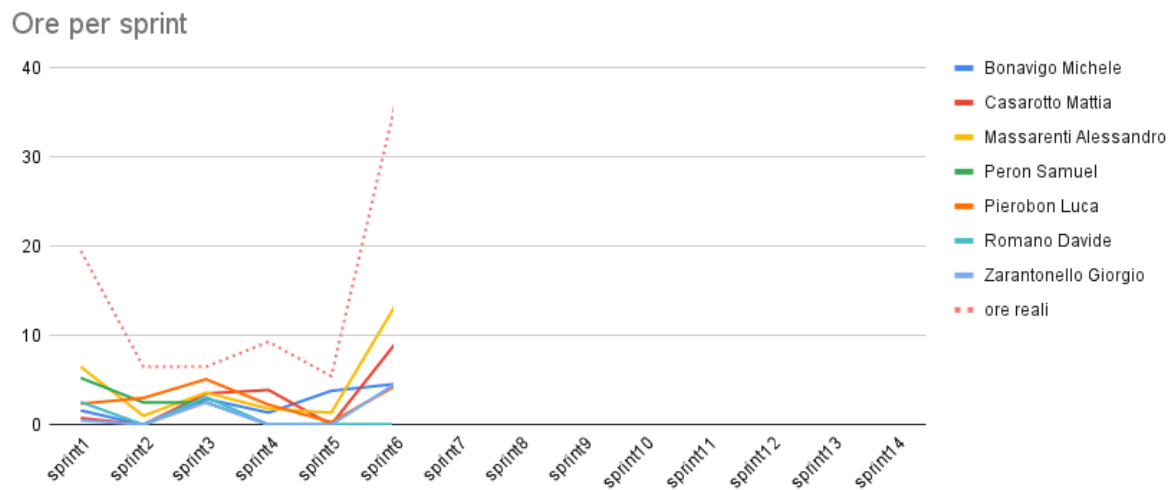


Figura 1: Andamento ore utilizzate nei vari sprint

- il proponente non ha ancora definito il supporto hardware per i lampioni a cui dovremo far fede.

Queste verranno discusse in sede di preparazione del prossimo sprint.
