



Università di Padova



sweasabi@gmail.com

Corso di Ingegneria del Software A.A.:2022/2023

# Verbale *Sprint 4*

dal 4 dic 2022 al 17 dic 2022

<b>Approvazione</b>	Casarotto Mattia
<b>Segreteria</b>	Casarotto Mattia Bonavigo Michele
<b>Verifica</b>	Massarenti Alessandro
<b>Uso</b>	Interno Esterno
<b>Destinatario</b>	<i>Il gruppo</i> Committente

## Indice

<b>1</b>	<b>Ruoli</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Preventivo</b>	<b>2</b>
2.1	Milestones: . . . . .	2
2.1.1	Release versione 0.0.4 dell'analisi dei requisiti . . . . .	2
<b>3</b>	<b>Consuntivazione</b>	<b>2</b>
3.1	Milestones: . . . . .	2
3.2	Attività svolte . . . . .	2
3.3	Difficoltà e problemi di sprint . . . . .	3

# 1 Ruoli

I ruoli in questo sprint sono rimasti gli stessi dello sprint precedente, vedasi verbale SPR\_20221120.

## I ruoli principali:

Nominativo	Ruolo
Bonavigo Michele	Verificatore
Casarotto Mattia	Responsabile
Massarenti Alessandro	Analista
Peron Samuel	Analista
Pierobon Luca	Amministratore
Romano Davide	Analista
Zarantonello Giorgio	Analista

# 2 Preventivo

In questo sprint abbiamo preventivato di sistemare le questioni di workflow amministrativo, andare avanti con l'analisi dei requisiti e in particolare con i casi d'uso.

## 2.1 Milestones:

### 2.1.1 Release versione 0.0.4 dell'analisi dei requisiti

È la principale milestone di questo sprint.

Questa milestone è registrata qui

# 3 Consuntivazione

## 3.1 Milestones:

- Release versione 0.0.4 dell'analisi dei requisiti (Completa al: 75%)


## 3.2 Attività svolte

Attività	Stato	Ruolo
creazione e manutenzione workflow amministrativi	completato	Amministratore
confronto con proponente	completato	Analista
confronto con committente	completato	Analista

Tabella 1: Lista delle attività svolte durante lo sprint

	Re	Amm	An	Pro	Prog	Ver	tot
Bonavigo Michele	0	0	0	0	0	1,35	1,35
Casarotto Mattia	3,9	0	0	0	0	0	3,9
Massarenti Alessandro	0	0	1,3	0	0	0,5	1,8
Peron Samuel	0	0	0	0	0	0	0
Pierobon Luca	0	2,25	0	0	0	0	2,25
Romano Davide	0	0	0	0	0	0	0
Zarantonello Giorgio	0	0	0	0	0	0	0
	3,9	2,25	1,3	0	0	1,85	

Tabella 2: Spartizione dei ruoli e ore svolte durante lo sprint

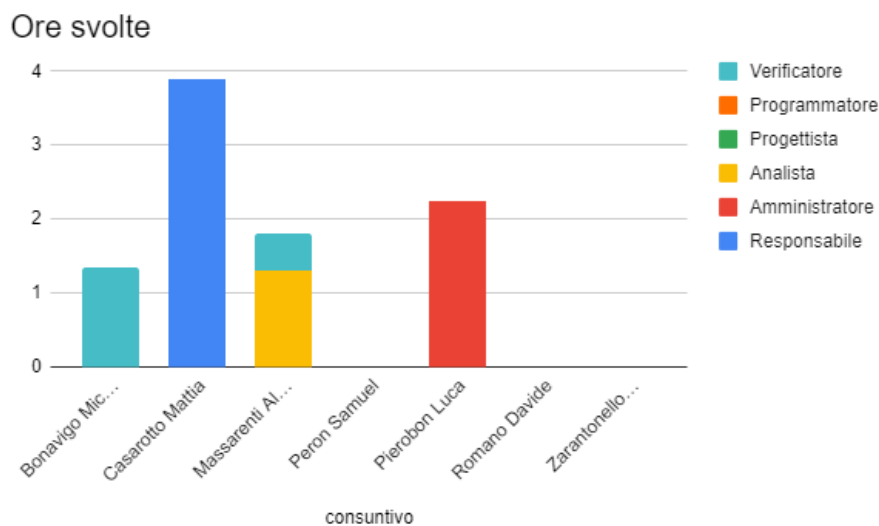

	Ore	Costo
Responsabile	3,9	€ 117,00
Amministratore	2,25	€ 45,00
Analista	1,3	€ 32,50
Progettista	0	€ 0,00
Programmatore	0	€ 0,00
Verificatore	1,85	€ 27,75
totale	9,3	€ 222,25

Tabella 3: Spartizione dei ruoli e ore svolte durante lo sprint

Avendo quindi consumato €222,25<sup>1</sup> del budget durante questo sprint, rimangono ancora a disposizione € 12780,50 per gli sprint seguenti.

### 3.3 Difficoltà e problemi di sprint

Alcune questioni sono risultate durante questo sprint:

- Conciliare impegni personali per incontri.

Queste verranno discusse in sede di preparazione del prossimo sprint.

<sup>1</sup>Si veda tabella 3
