



Università di Padova



sweasabi@gmail.com

Corso di Ingegneria del Software A.A.:2022/2023

Verbale *Sprint 5*

dal 18 dic 2022 al 31 dic 2022

Approvazione	Bonavigo Michele
Segreteria	Massarenti Alessandro Bonavigo Michele
Verifica	Pierobon Luca
Uso	Interno Esterno
Destinatario	<i>Il gruppo</i> Committente

Indice

1	Ruoli	2
2	Preventivo	2
2.1	Milestones:	2
2.1.1	Release versione 0.0.4 dell'analisi dei requisiti	2
3	Consuntivazione	2
3.1	Milestones:	2
3.2	Attività svolte	2
3.3	Trend e riflessioni	3
3.4	Difficoltà e problemi di sprint	4

1 Ruoli

I ruoli in questo sprint sono cambiati rispetto allo sprint precedente, come da verbale VIN_20221219.

I ruoli principali:

Nominativo	Ruolo
Bonavigo Michele	Responsabile
Casarotto Mattia	Analista
Massarenti Alessandro	Analista
Peron Samuel	Analista
Pierobon Luca	Verificatore
Romano Davide	Analista
Zarantonello Giorgio	Analista

2 Preventivo

In questo sprint abbiamo preventivato di sviluppare il **PdP**, il **PoC** ed il **PdQ**.

2.1 Milestones:

2.1.1 Release versione 0.0.4 dell'analisi dei requisiti

È la principale milestone di questo sprint.

Questa milestone è registrata qui

3 Consuntivazione

3.1 Milestones:

- Release versione 0.0.4 dell'analisi dei requisiti (Completa al: 75%)


3.2 Attività svolte

Attività	Stato	Ruolo
standardizzato repository delle NdP	completato	Amministratore
inizializzato repository del PoC	completato	Amministratore

Tabella 1: Lista delle attività svolte durante lo sprint

	Re	Amm	An	Pro	Prog	Ver	tot
Bonavigo Michele	3,5	0	0	0	0	0,3	3,8
Casarotto Mattia	0	0	0	0	0	0	0
Massarenti Alessandro	0	0,8	0	0	0	0,55	1,35
Peron Samuel	0	0	0	0	0	0	0
Pierobon Luca	0	0,3	0	0	0	0	0,3
Romano Davide	0	0	0	0	0	0	0
Zarantonello Giorgio	0	0	0	0	0	0	0
	3,5	1,1	0	0	0	0,85	

Tabella 2: Spartizione dei ruoli e ore svolte durante lo sprint

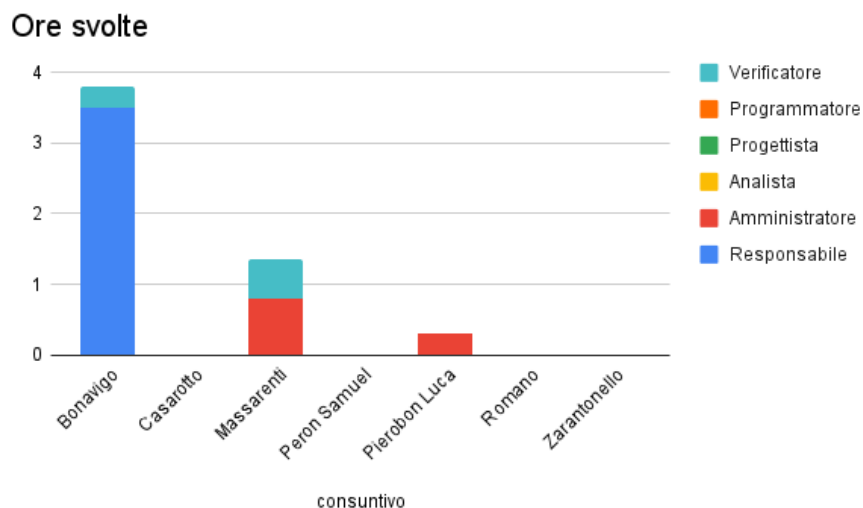

	Ore	Costo
Responsabile	3,5	€ 105,00
Amministratore	1,1	€ 22,00
Analista	0	€ 0,00
Progettista	0	€ 0,00
Programmatore	0	€ 0,00
Verificatore	0,85	€ 12,75
totale	5,45	€ 139,75

Tabella 3: Spartizione dei ruoli e ore svolte durante lo sprint

Avendo quindi consumato €139,75¹ del budget durante questo sprint, rimangono ancora a disposizione € 12640,75 per gli sprint seguenti.

3.3 Trend e riflessioni

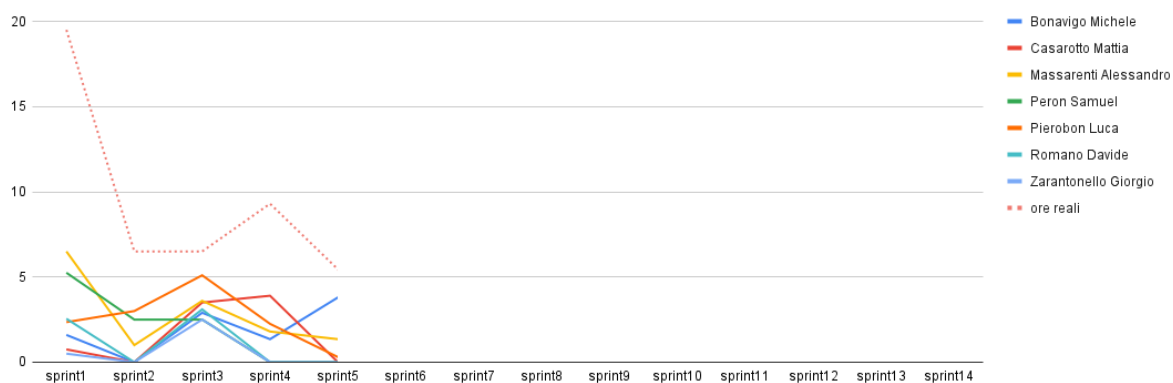


Figura 1: Andamento ore utilizzate nei vari sprint

Si può notare nella figura 1 un trend negativo, va però contestualizzato con l'inizio del periodo natalizio. Probabilmente nello sprint 6 vedremo l'inizio di un trend in ascesa.

¹Si veda tabella 3

3.4 Difficoltà e problemi di sprint

Alcune questioni sono risultate durante questo sprint:

- nello sviluppo del **PoC** abbiamo incontrato difficoltà a comprendere completamente il funzionamento del sistema *CORS* del browser;
- il proponente ha cambiato il supporto hardware per problemi di reperimento dello stesso, questo apporterà modifiche all'analisi dei requisiti;
- difficoltà nella gestione delle attività durante le vacanze.

Queste verranno discusse in sede di preparazione del prossimo sprint.
