



Università di Padova



sweasabi@gmail.com

Corso di Ingegneria del Software A.A.:2022/2023

Verbale *Sprint 6*

dal 1 gen 2023 al 14 gen 2023

Approvazione	Bonavigo Michele
Segreteria	Bonavigo Michele Massarenti Alessandro
Verifica	Massarenti Alessandro
Uso	Interno Esterno
Destinatario	<i>Il gruppo</i> Committente

Indice

1	Ruoli	2
2	Preventivo	2
2.1	Milestones:	2
2.1.1	Release versione 0.0.4 dell'analisi dei requisiti	2
3	Consuntivazione	2
3.1	Milestones:	2
3.2	Attività svolte	2
3.3	Trend e riflessioni	3
3.4	Difficoltà e problemi di sprint	3

1 Ruoli

I ruoli in questo sprint sono rimasti gli stessi dello sprint precedente.

I ruoli principali:

Nominativo	Ruolo
Bonavigo Michele	Responsabile
Casarotto Mattia	Analista
Massarenti Alessandro	Analista
Peron Samuel	Analista
Pierobon Luca	Verificatore
Romano Davide	Analista
Zarantonello Giorgio	Analista

2 Preventivo

In questo sprint abbiamo preventivato di sviluppare il **PoC** e le **Norme di Progetto**.

2.1 Milestones:

2.1.1 Release versione 0.0.4 dell'analisi dei requisiti

È la principale milestone di questo sprint.

Questa milestone è registrata qui

3 Consuntivazione

3.1 Milestones:

- Release versione 0.0.4 dell'analisi dei requisiti (Completa al: 80%)


3.2 Attività svolte

Attività	Stato	Ruolo
aggiunti processi primari alle Norme di Progetto	completato	Amministratore
aggiunti processi di supporto alle Norme di Progetto	completato	Amministratore
definite norme di codifica	completato	Amministratore
documentato il PoC	completato	Amministratore
progredito con il PoC	completato	Amministratore

Tabella 1: Lista delle attività svolte durante lo sprint

	Re	Amm	An	Pro	Prog	Ver	tot
Bonavigo Michele	2,4	1,7	0	0	0	0,45	4,55
Casarotto Mattia	0	0	8,9	0	0	0	8,9
Massarenti Alessandro	0,4	5,95	5,75	0	0	1	13,1
Peron Samuel	0	0	0	0	0	0	0
Pierobon Luca	0	0	0,35	0	0	3,9	4,25
Romano Davide	0	0	0	0	0	0	0
Zarantonello Giorgio	0	0	4,5	0	0	0	4,5
	2,8	7,65	19,5	0	0	5,35	

Tabella 2: Spartizione dei ruoli e ore svolte durante lo sprint

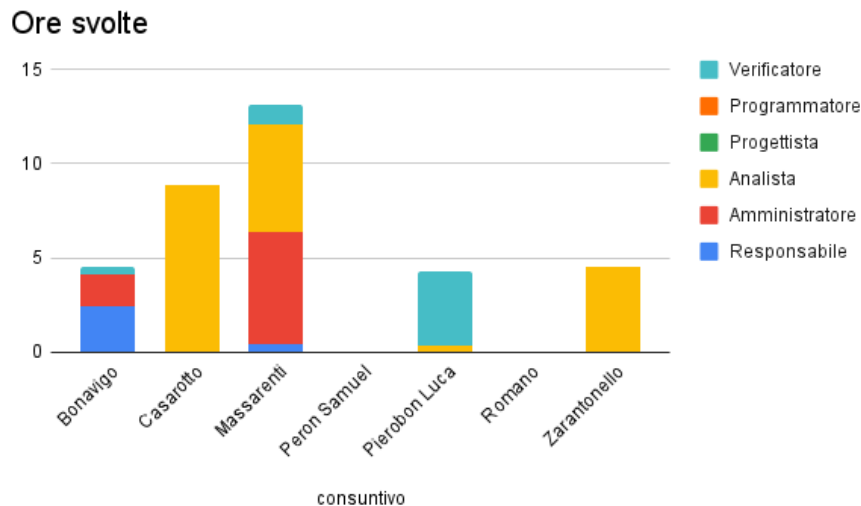

	Ore	Costo
Responsabile	2,8	€ 84,00
Amministratore	7,65	€ 153,00
Analista	19,5	€ 487,50
Progettista	0	€ 0,00
Programmatore	0	€ 0,00
Verificatore	5,35	€ 80,25
totale	35,3	€ 804,75

Tabella 3: Spartizione dei ruoli e ore svolte durante lo sprint

Avendo quindi consumato €804,75¹ del budget durante questo sprint, rimangono ancora a disposizione € 11836,00 per gli sprint seguenti.

3.3 Trend e riflessioni

Come preventivato nel verbale SPR_20230101, ovvero quello precedente, possiamo notare nella figura 1 un trend positivo.

È nostro desiderio mantenere questo ritmo.

3.4 Difficoltà e problemi di sprint

Alcune questioni sono risultate durante questo sprint:

¹Si veda tabella 3

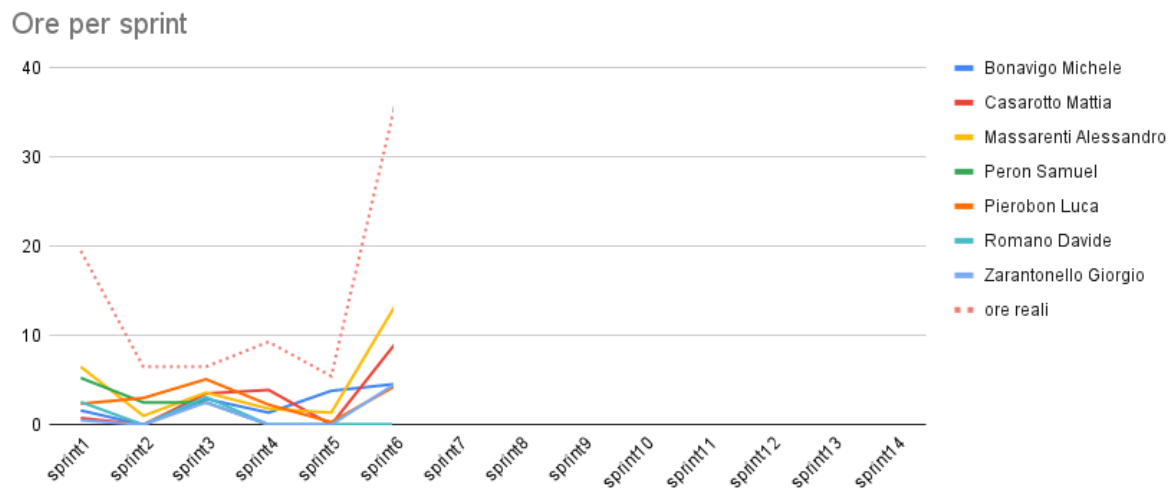


Figura 1: Andamento ore utilizzate nei vari sprint

- il proponente non ha ancora definito il supporto hardware per i lampioni a cui dovremo far fede.

Queste verranno discusse in sede di preparazione del prossimo sprint.
