



Università di Padova



sweasabi@gmail.com

Corso di Ingegneria del Software A.A.:2022/2023

# Verbale *Sprint 7*

dal 15 gen 2023 al 28 gen 2023

<b>Approvazione</b>	Massarenti Alessandro
<b>Segreteria</b>	Bonavigo Michele Massarenti Alessandro
<b>Verifica</b>	Pierobon Luca
<b>Uso</b>	Interno Esterno
<b>Destinatario</b>	<i>Il gruppo</i> Committente

## Indice

<b>1</b>	<b>Ruoli</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Preventivo</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Consuntivazione</b>	<b>2</b>
3.1	Attività svolte . . . . .	2
3.2	Trend e riflessioni . . . . .	3
3.3	Difficoltà e problemi di sprint . . . . .	4

# 1 Ruoli

I ruoli in questo sprint sono cambiati rispetto allo sprint precedente, come da verbale VIN\_20230114.

## I ruoli principali:

Nominativo	Ruolo
Bonavigo Michele	Analista
Casarotto Mattia	Analista
Massarenti Alessandro	Responsabile
Peron Samuel	Analista
Pierobon Luca	Verificatore
Romano Davide	Analista
Zarantonello Giorgio	Analista

## 2 Preventivo

In questo sprint abbiamo preventivato di sviluppare le **Norme di Progetto**.

Questo sprint non ha poi preventivato molto altro perché svolto durante un intenso periodo di esami.

## 3 Consuntivazione


### 3.1 Attività svolte

Attività	Stato	Ruolo
verificata stesura processi primari avvenuta nell'iterazione precedente	completato	Amministratore
svolte requisiti burocratici	completato	Responsabile

Tabella 1: Lista delle attività svolte durante lo sprint

	Re	Amm	An	Pro	Prog	Ver	tot
Bonavigo Michele	0,5	0	0	0	0	0	0,5
Casarotto Mattia	0	0	0	0	0	0	0
Massarenti Alessandro	0,7	0,1	0	0	0	0,4	1,2
Peron Samuel	0	0	0	0	0	0	0
Pierobon Luca	0	0	0	0	0	0,3	0,3
Romano Davide	0	0	0	0	0	0	0
Zarantonello Giorgio	0	0	0	0	0	0	0
	1,2	0,1	0	0	0	0,7	

Tabella 2: Spartizione dei ruoli e ore svolte durante lo sprint

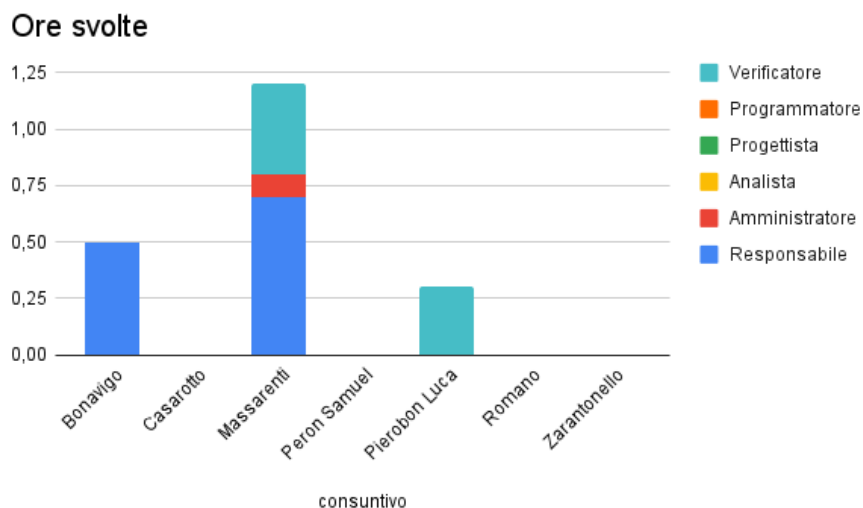

	Ore	Costo
Responsabile	1,2	€ 36,00
Amministratore	0,1	€ 2,00
Analista	0	€ 0,00
Progettista	0	€ 0,00
Programmatore	0	€ 0,00
Verificatore	0,7	€ 10,50
totale	2	€ 48,50

Tabella 3: Spartizione dei ruoli e ore svolte durante lo sprint

Avendo quindi consumato €48,50<sup>1</sup> del budget durante questo sprint, rimangono ancora a disposizione € 11787,50 per gli sprint seguenti.

### 3.2 Trend e riflessioni

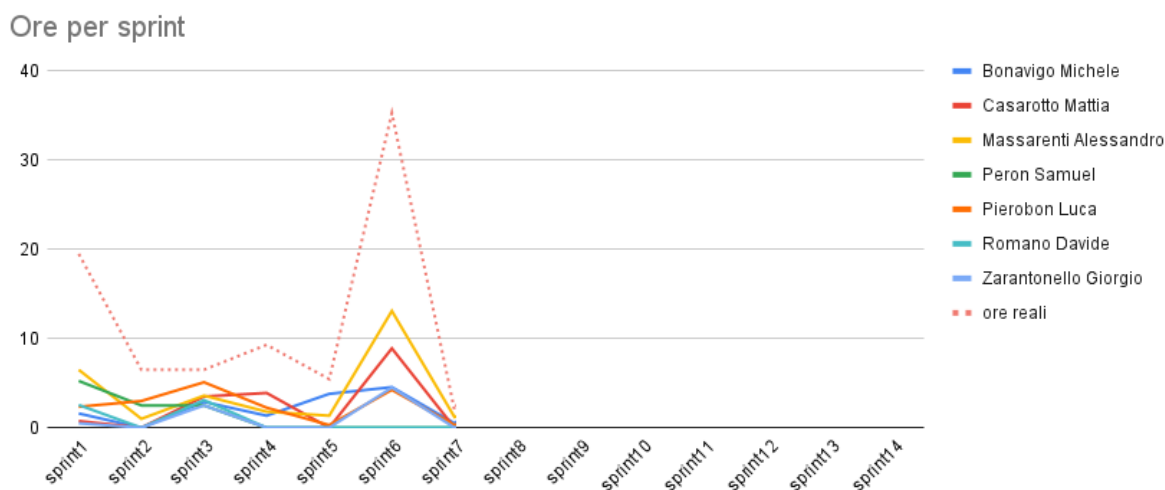


Figura 1: Andamento ore utilizzate nei vari sprint

<sup>1</sup>Si veda tabella 3

Come descritto nella sezione 2 relativa al preventivo, questo sprint è molto rallentato per via degli esami in corso. Il gruppo non è soddisfatto e prevede di impegnarsi con più decisione negli sprint successivi.

### 3.3 Difficoltà e problemi di sprint

Alcune questioni sono risultate<sup>2</sup> durante questo sprint:

- il gruppo si è concentrato molto sugli esami, mettendo in primo piano gli obiettivi a breve termine;
- il proponente non ha ancora definito il supporto hardware per i lampioni a cui dovremo far fede.

In retrospettiva il gruppo ha iniziato ad elaborare come la scelta di mettere in coda questa attività non sia costruttiva. Il feedback al diario di bordo DRO\_20230129 ci ha aiutato a ragionare e a comprendere meglio la questione.

Queste difficoltà verranno inoltre discusse in sede di preparazione del prossimo sprint.

---

<sup>2</sup>alcune questioni purtroppo non sono state risolte rispetto allo sprint precedente
