



Università di Padova



sweasabi@gmail.com

Corso di Ingegneria del Software A.A.:2022/2023

Verbale *Sprint 8*

dal 29 gen 2023 al 11 feb 2023

Approvazione	Massarenti Alessandro
Segreteria	Bonavigo Michele Massarenti Alessandro
Verifica	Pierobon Luca
Uso	Interno Esterno
Destinatario	<i>Il gruppo</i> Committente

Indice

1	Ruoli	2
2	Preventivo	2
2.1	Milestones:	2
2.1.1	Release versione 0.0.4 dell'analisi dei requisiti	2
3	Consuntivazione	2
3.1	Milestones:	2
3.2	Attività svolte	2
3.3	Trend e riflessioni	4
3.4	Difficoltà e problemi di sprint	4

1 Ruoli

I ruoli in questo sprint sono rimasti gli stessi dello sprint precedente¹.

I ruoli principali:

Nominativo	Ruolo
Bonavigo Michele	Analista
Casarotto Mattia	Analista
Massarenti Alessandro	Responsabile
Peron Samuel	Analista
Pierobon Luca	Verificatore
Romano Davide	Analista
Zarantonello Giorgio	Analista

2 Preventivo

In questo sprint abbiamo preventivato di continuare lo sviluppo dell'**AdR**, di validare il **PoC** assieme al proponente. La validazione è stata preventivata in ottica di revisione con il committente.

2.1 Milestones:

2.1.1 Release versione 0.0.4 dell'analisi dei requisiti

È la principale milestone di questo sprint.

L'obiettivo è di rilasciare questa versione al termine di questo sprint.

Questa milestone è registrata qui.

3 Consuntivazione

3.1 Milestones:

- Release versione 0.0.4 (Completa al: 99%)

3.2 Attività svolte


Attività	Stato	Ruolo
confronto con il proponente relativamente al PoC	completato	Analista
redazione e consolidamento dei casi d'uso	completato	Analista
documentate le modifiche al PoC dopo visione con il proponente	completato	Analista

Tabella 1: Lista delle attività svolte durante lo sprint

¹definiti nel verbale VIN_20230114

	Re	Amm	An	Pro	Prog	Ver	tot
Bonavigo Michele	1,5	0	3,15	0	0	1,75	6,4
Casarotto Mattia	0	0	1,65	0	0	0	1,65
Massarenti Alessandro	3,3	0	0,9	0	0	0,6	4,8
Peron Samuel	0	0	0	0	0	0	0
Pierobon Luca	0	0	0	0	0	3,3	3,3
Romano Davide	0	0	0	0	0	0	0
Zarantonello Giorgio	0	0	1,75	0	0	0	1,75
	4,8	0	7,45	0	0	5,65	

Tabella 2: Spartizione dei ruoli e ore svolte durante lo sprint

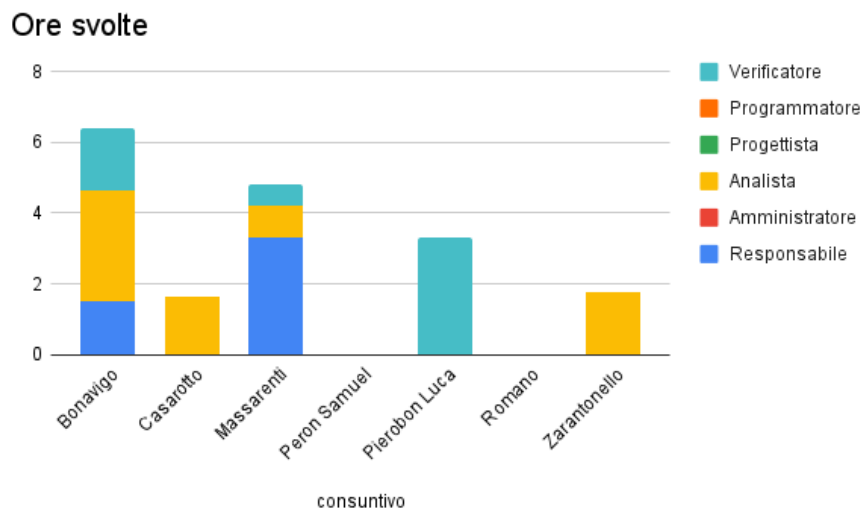

	Ore	Costo
Responsabile	4,8	€ 144,00
Amministratore	0	€ 0,00
Analista	7,45	€ 186,25
Progettista	0	€ 0,00
Programmatore	0	€ 0,00
Verificatore	5,65	€ 84,75
totale	17,9	€ 415,00

Tabella 3: Spartizione dei ruoli e ore svolte durante lo sprint

Avendo quindi consumato €415,00² del budget durante questo sprint, rimangono ancora a disposizione € 11372,50 per gli sprint seguenti.

²Si veda tabella 3

3.3 Trend e riflessioni

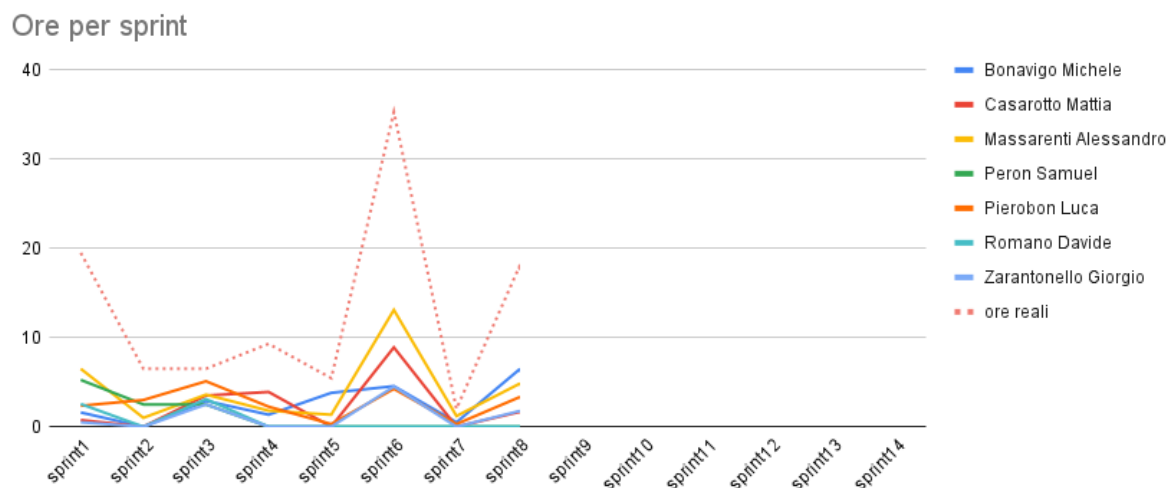


Figura 1: Andamento ore utilizzate nei vari sprint

Dopo aver notato nello sprint precedente come il mettere in coda le attività di progetto non sia costruttivo, il gruppo ha lavorato per aumentare il ritmo.

È desiderio del gruppo continuare a lavorare su questo aspetto.

3.4 Difficoltà e problemi di sprint

Non ci sono state grandi difficoltà esterne durante questo sprint. Purtroppo però, come negli sprint appena precedenti, non siamo ancora riusciti a definire con il proponente il supporto hardware per i lampioni a cui dovremo fare fede.

Nonostante il gruppo abbia lavorato per aumentare il ritmo, questa tendenza non è stata seguita da tutti i membri. Si può notare in figura 1 come alcuni membri non abbiano migliorato il loro trend non partecipativo iniziato nello sprint 4.

Queste verranno discusse in sede di preparazione del prossimo sprint.
