

Università di Padova



sweasabi@gmail.com

Corso di Ingegneria del Software A.A.:2022/2023

# Verbale *Sprint 9*

dal 12 feb 2023 al 25 feb 2023

<b>Approvazione</b>	Massarenti Alessandro
<b>Segreteria</b>	Bonavigo Michele
	Massarenti Alessandro
<b>Verifica</b>	Pierobon Luca
<b>Uso</b>	Interno
	Esterno
<b>Destinatario</b>	<i>Il gruppo</i>
	Committente

## Indice

<b>1</b>	<b>Ruoli</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Preventivo</b>	<b>2</b>
2.1	Milestones: . . . . .	2
2.1.1	Release versione 0.0.4 dell'analisi dei requisiti . . . . .	2
2.1.2	Release versione 0.0.5 dell'analisi dei requisiti . . . . .	2
<b>3</b>	<b>Consuntivazione</b>	<b>2</b>
3.1	Milestones: . . . . .	2
3.2	Attività svolte . . . . .	3
3.3	Trend e riflessioni . . . . .	4
3.4	Difficoltà e problemi di sprint . . . . .	4

# 1 Ruoli

I ruoli in questo sprint sono rimasti gli stessi dello sprint precedente<sup>1</sup>.

## I ruoli principali:

Nominativo	Ruolo
Bonavigo Michele	Analista
Casarotto Mattia	Analista
Massarenti Alessandro	Responsabile
Peron Samuel	Analista
Pierobon Luca	Verificatore
Romano Davide	Analista
Zarantonello Giorgio	Analista

# 2 Preventivo

In questo sprint abbiamo preventivato di effettuare un colloquio con il committente per meglio comprendere le aspettative in ingresso alla revisione **RTB**.

## 2.1 Milestones:

### 2.1.1 Release versione 0.0.4 dell'analisi dei requisiti

L'obiettivo è di rilasciare questa versione all'inizio di questo sprint.

Questa milestone è registrata qui.

### 2.1.2 Release versione 0.0.5 dell'analisi dei requisiti

È la principale milestone di questo sprint.

L'obiettivo è di rilasciare questa versione al termine di questo sprint.

Questa milestone è registrata qui.

# 3 Consuntivazione

## 3.1 Milestones:

- Release versione 0.0.4 dell'analisi dei requisiti (Completa al: 100%)
- Release versione 0.0.5 dell'analisi dei requisiti (Completa al: 60%)

---

<sup>1</sup>definiti nel verbale VIN\_20230114


### 3.2 Attività svolte

Attività	Stato	Ruolo
riviste e riorganizzate tutte le UC	completato	Analista
rilasciata versione 0.0.4 dell'analisi dei requisiti	completato	Responsabile
finalizzata documentazione del PoC	completato	Analista
normata codifica dei requisiti	parziale	Amministratore

Tabella 1: Lista delle attività svolte durante lo sprint

	Re	Amm	An	Pro	Prog	Ver	tot
Bonavigo Michele	0,5	0	0	0	0	0	0,5
Casarotto Mattia	0	0	0	0	0	0	0
Massarenti Alessandro	0,7	0	0	0	0	0,4	1,1
Peron Samuel	0	0	0	0	0	0	0
Pierobon Luca	0	0	0,75	0	0	0,35	1,1
Romano Davide	0	0	0	0	0	0	0
Zarantonello Giorgio	0	0	0	0	0	0	0
	1,2	0	0,75	0	0	0,75	

Tabella 2: Spartizione dei ruoli e ore svolte durante lo sprint

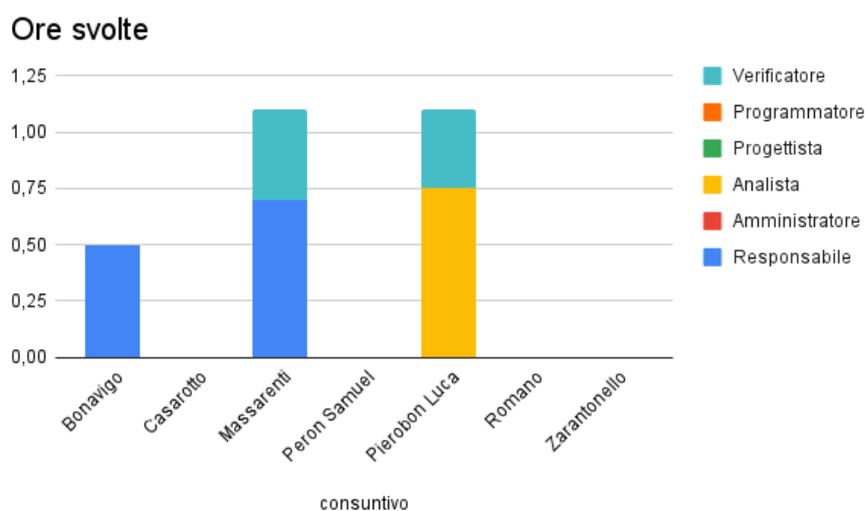

	Ore	Costo
Responsabile	1,2	€ 36,00
Amministratore	0	€ 0,00
Analista	0,75	€ 18,75
Progettista	0	€ 0,00
Programmatore	0	€ 0,00
Verificatore	0,75	€ 11,25
totale	2,7	€ 66,00

Tabella 3: Spartizione dei ruoli e ore svolte durante lo sprint

Avendo quindi consumato €66,00<sup>2</sup> del budget durante questo sprint, rimangono ancora a disposizione € 11306,50 per gli sprint seguenti.

### 3.3 Trend e riflessioni

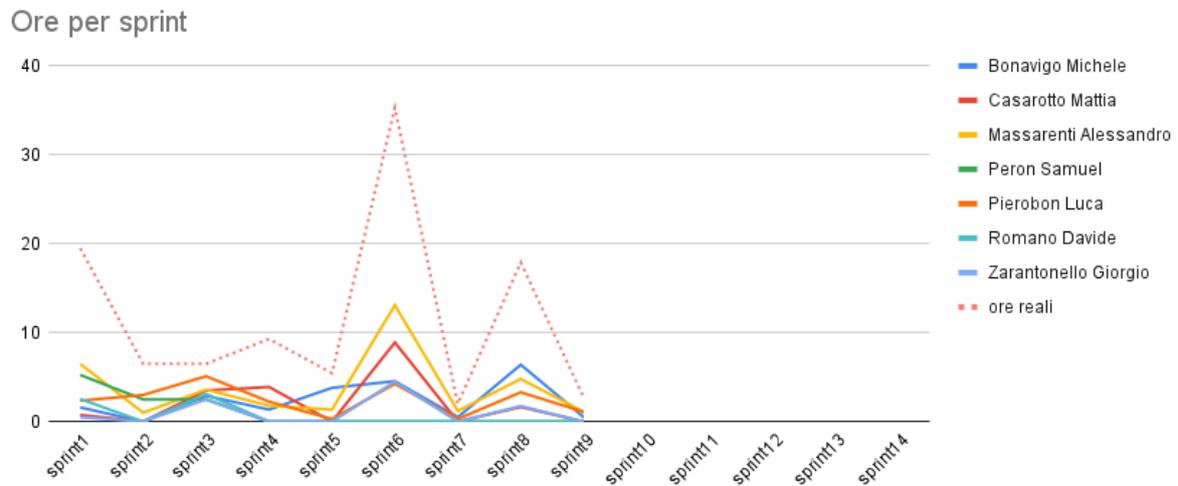


Figura 1: Andamento ore utilizzate nei vari sprint

Durante questo sprint, purtroppo, l'attività degli esami si è intensificata per tutti i membri del gruppo. Nonostante i buoni propositi prefissati, le attività di progetto sono drasticamente rallentate.

Prevediamo nel prossimo sprint di recuperare il tempo perduto.

### 3.4 Difficoltà e problemi di sprint

Non ci sono state grandi difficoltà esterne durante questo sprint. Purtroppo però, come negli sprint appena precedenti, non siamo ancora riusciti a definire con il proponente il supporto hardware per i lampioni a cui dovremo fare fede.

Internamente, come difficoltà, si rimanda alla riflessione posta nella sezione 3.3.

Queste verranno discusse in sede di preparazione del prossimo sprint.

---

<sup>2</sup>Si veda tabella 3
