



Università di Padova



sweasabi@gmail.com

Corso di Ingegneria del Software A.A.:2022/2023

Verbale *Sprint 11*

dal 12 mar 2023 al 25 mar 2023

Approvazione	Pierobon Luca
Segreteria	Bonavigo Michele Massarenti Alessandro
Verifica	Casarotto Mattia
Uso	Interno Esterno
Destinatario	<i>Il gruppo</i> Committente

Indice

1	Ruoli	3
2	Preventivo	3
2.1	Milestones:	3
2.1.1	Release versione 0.0.6 dell'analisi dei requisiti	3
2.1.2	Release versione 0.1.0 dell'analisi dei requisiti	3
2.1.3	Release versione 1.0.0 dell'analisi dei requisiti	3
3	Consuntivazione	3
3.1	Milestones:	3
3.2	Attività svolte	4
3.3	Trend e riflessioni	5

3.4	Difficoltà e problemi di sprint	5
-----	---	---

1 Ruoli

I ruoli in questo sprint sono cambiati rispetto allo sprint precedente, come da verbale VIN_20230321.

I ruoli principali:

Nominativo	Ruolo
Bonavigo Michele	Analista
Casarotto Mattia	Verificatore
Massarenti Alessandro	Analista
Peron Samuel	Analista
Pierobon Luca	Responsabile
Romano Davide	Analista
Zarantonello Giorgio	Analista

2 Preventivo

In questo sprint abbiamo preventivato di effettuare la revisione **RTB** in data 17/03/2023, pertanto l'obiettivo di questo sprint è quello di rilasciare i documenti necessari.

2.1 Milestones:

2.1.1 Release versione 0.0.6 dell'analisi dei requisiti

L'obiettivo è di rilasciare questa versione all'inizio di questo sprint.

Questa milestone è registrata qui.

2.1.2 Release versione 0.1.0 dell'analisi dei requisiti

È la seconda principale milestone di questo sprint.

L'obiettivo è di rilasciare questa versione durante questo sprint.

Questa milestone è registrata qui.

2.1.3 Release versione 1.0.0 dell'analisi dei requisiti

È la principale milestone di questo sprint.

L'obiettivo è di rilasciare questa versione al termine di questo sprint.

Questa milestone è registrata qui.

3 Consuntivazione

3.1 Milestones:

- Release versione 0.0.6 dell'analisi dei requisiti (Completa al: 100%)
- Release versione 0.1.0 dell'analisi dei requisiti (Completa al: 60%)
- Release versione 0.1.1 dell'analisi dei requisiti (Completa al: 100%)
- Release versione 1.0.0 dell'analisi dei requisiti (Completa al: 100%)


3.2 Attività svolte

Attività	Stato	Ruolo
Stesura Piano di Qualifica e Piano di Progetto	parziale	Analista
rilasciata versione 0.0.6 dell'analisi dei requisiti	completato	Responsabile
rilasciata versione 0.1.0 dell'analisi dei requisiti	completato	Responsabile
rilasciata versione 0.1.1 dell'analisi dei requisiti	completato	Responsabile
rilasciata versione 1.0.0 dell'analisi dei requisiti	completato	Responsabile
migliorata interfaccia grafica del PoC	completato	Analista
finalizzazione documentazione per revisione RTB	parziale	Analista

Tabella 1: Lista delle attività svolte durante lo sprint

	Re	Amm	An	Pro	Prog	Ver	tot
Bonavigo Michele	0	0,45	0	0	0	1,7	2,15
Casarotto Mattia	0	0,45	0	0	0	0,5	0,95
Massarenti Alessandro	2	0	0	0	0	2,8	4,8
Peron Samuel	0	6,5	0	0	0	0	6,5
Pierobon Luca	0	0	0	0	0	1	1
Romano Davide	0	0,5	0	0	0	0	0,5
Zarantonello Giorgio	0	0	0	0	0	0	0
	2	7,9	0,75	0	0	6	

Tabella 2: Spartizione dei ruoli e ore svolte durante lo sprint

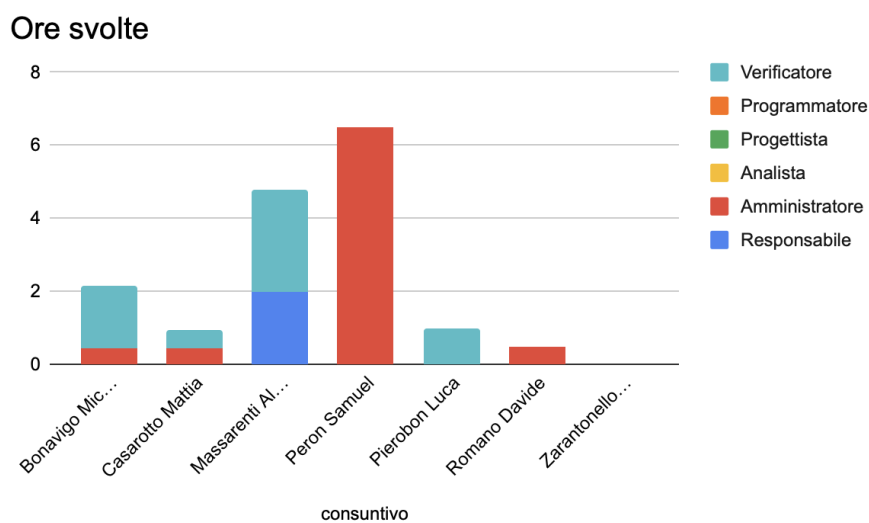

Avendo quindi consumato €308,00¹ del budget durante questo sprint, rimangono ancora a disposizione € 9598,50 per gli sprint seguenti.

¹Si veda tabella 3

	Ore	Costo
Responsabile	2	€ 60,00
Amministratore	7,9	€ 158,00
Analista	0	€ 0,00
Progettista	0	€ 0,00
Programmatore	0	€ 0,00
Verificatore	6	€ 90,00
totale	15,9	€ 308,00

Tabella 3: Spartizione dei ruoli e ore svolte durante lo sprint

3.3 Trend e riflessioni

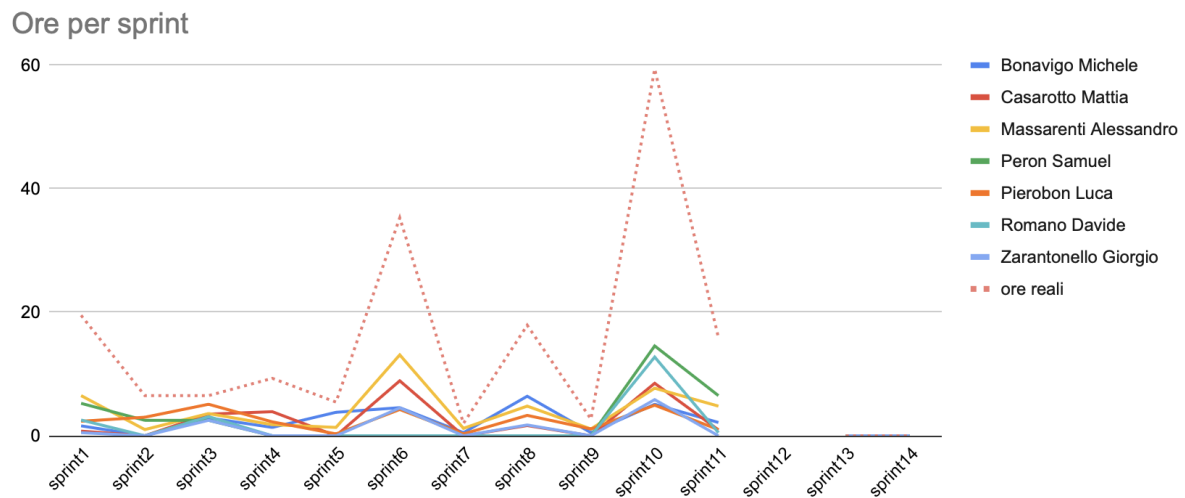


Figura 1: Andamento ore utilizzate nei vari sprint

Durante questo sprint è stato registrato un calo della produttività generale, ma nonostante ciò si è comunque riusciti a progredire in vista della revisione RTB, con la presentazione al professor Cardin (che ha rilasciato il semaforo verde) di scelte tecnologiche, PoC e Analisi dei Requisi.

Prevediamo nel prossimo sprint di recuperare il tempo perduto.

3.4 Difficoltà e problemi di sprint

Non ci sono state grandi difficoltà esterne durante questo sprint. L'unica difficoltà riscontrata è stato il cambio del supporto hardware, rispetto a quanto definito in sede di presentazione del capitolato, per i lampioni a cui dovremo fare fede.

Internamente, come difficoltà, si rimanda alla riflessione posta nella sezione 3.3.

Queste verranno discusse in sede di preparazione del prossimo sprint.
