



Università di Padova



sweasabi@gmail.com

Corso di Ingegneria del Software A.A.:2022/2023

Verbale *Sprint 1*

dal 7 nov 2022 al 13 nov 2022

Approvazione	Peron Samuel
Segreteria	Peron Samuel Massarenti Alessandro
Verifica	Massarenti Alessandro
Uso	Interno Esterno
Destinatario	<i>Il gruppo</i> Committente

Indice

1	Ruoli	2
2	Preventivo	2
2.1	Milestones:	2
2.1.1	Analisi dei requisiti V0.0.1	2
2.1.2	Requirements and technology baseline	2
3	Consuntivazione	2
3.1	Milestones:	2
3.2	Attività svolte	3
3.3	Difficoltà e problemi di sprint	4

1 Ruoli

In questo sprint che è iniziato in una fase di assestamento del gruppo, sono stati assegnati dei ruoli principali ad ognuno dei componenti.

Si è comunque ricorso a qualche cambio di ruolo al volo sempre tenendo però fede al principio di esecuzione separata dalla verifica.

I ruoli principali:

Nominativo	Ruolo
Bonavigo Michele	Analista
Casarotto Mattia	Analista
Massarenti Alessandro	Verificatore
Peron Samuel	Responsabile
Pierobon Luca	Amministratore
Romano Davide	Analista
Zarantonello Giorgio	Analista

2 Preventivo

In questo sprint l'obiettivo è stato quello di preparare documentazione a sufficienza per una prima revisione con il mentore/proponente e con il committente. Questo obiettivo si è quindi trasformato nelle seguenti milestones.

2.1 Milestones:

2.1.1 Analisi dei requisiti V0.0.1

Questa milestone si compone delle seguenti attività **preventivate**:

Attività	Ore previste
definizione testuale casi d'uso	0.5 h per singolo use case, 10 uc totali
stesura generale dell'analisi dei requisiti	0.5 h
stesura glossario	1h
esternalizzazione del documento di vision	1h
creazione di un ambiente meno piatto per la presentazione della documentazione utilizzando <i>github pages</i>	4h

2.1.2 Requirements and technology baseline

È la principale milestone che rimarrà attiva durante molteplici sprint.

Questa milestone è registrata qui

3 Consuntivazione

3.1 Milestones:

- Analisi dei requisiti v1.0.0 (Completa al: 50%)
- Requirements and technology baseline (Completa al: 30%)


Attività	Stato	Ruolo
definizione uc01	Completato	Analista
definizione uc02	Completato	Analista
definizione uc03	Completato	Analista
definizione uc04	Completato	Analista
definizione uc05	Completato	Analista
definizione uc06	Completato	Analista
definizione uc07	Completato	Analista
definizione uc08	Completato	Analista
definizione uc09	Completato	Analista
definizione uc10	Completato	Analista
stesura generale dell'analisi dei requisiti	Completato	Programmatore
stesura glossario	Non completato	
esternalizzazione del documento di vision	Completato	Programmatore
creazione di un ambiente <i>github pages</i>	Parzialmente completato	Amministratore

Tabella 1: Lista delle attività svolte durante lo sprint

3.2 Attività svolte

	Re	Amm	An	Pro	Prog	Ver	tot
Bonavigo Michele	0	0	1,5	0	0	0,1	1,6
Casarotto Mattia	0	0	0,75	0	0	0	0,75
Massarenti Alessandro	0	1,75	0,25	0	0	4,5	6,5
Peron Samuel	4	0	0	0	0	1,25	5,25
Pierobon Luca	0	0	0	0	0	2,35	2,35
Romano Davide	0	0	2,55	0	0	0	2,55
Zarantonello Giorgio	0	0	0,5	0	0	0	0,5
	4	1,75	5,55	0	0	8,2	

Tabella 2: Spartizione dei ruoli e ore svolte durante lo sprint

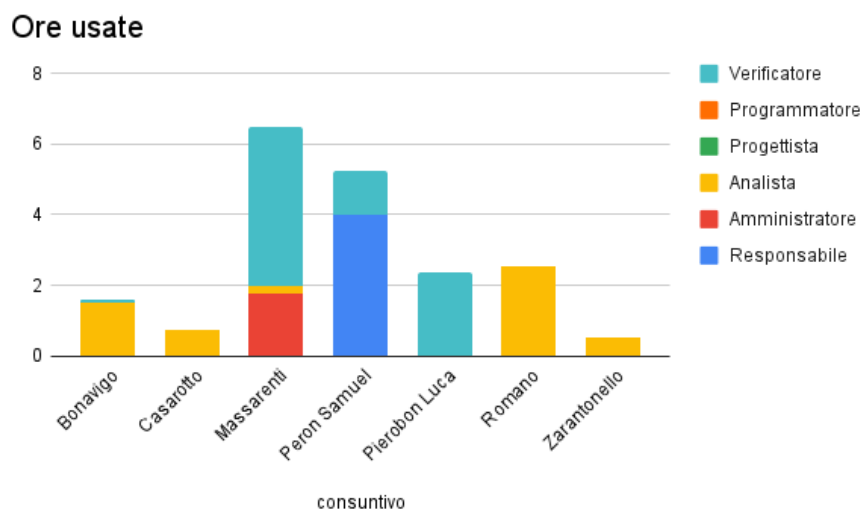

Avendo quindi consumato €416,75¹ del budget durante questo sprint, rimangono ancora a disposizione €13683,25 per gli sprint rimanenti.

¹Si veda tabella 3

	Ore	Costo
Responsabile	4	€ 120,00
Amministratore	1,75	€ 35,00
Analista	5,55	€ 138,75
Progettista	0	€ 0,00
Programmatore	0	€ 0,00
Verificatore	8,2	€ 123,00
totale	19,5	€ 416,75

Tabella 3: Spartizione dei ruoli e ore svolte durante lo sprint

3.3 Difficoltà e problemi di sprint

Alcune questioni sono risultate durante questo sprint:

- Alcune attività sono più lunghe dello sprint e non sono state spezzate abbastanza.
- Lo sprint potrebbe essere più lungo per evitare problemi di organizzazione.

Queste verranno discusse in sede di preparazione del prossimo sprint.
