



Università di Padova



sweasabi@gmail.com

Corso di Ingegneria del Software A.A.:2022/2023

Verbale *Sprint 3*

dal 20 nov 2022 al 3 dic 2022

Approvazione	Casarotto Mattia
Segreteria	Casarotto Mattia Bonavigo Michele
Verifica	Massarenti Alessandro
Uso	Interno Esterno
Destinatario	<i>Il gruppo</i> Committente

Indice

1	Ruoli	2
2	Preventivo	2
2.1	Milestones:	2
2.1.1	Release versione 0.0.3 dell'analisi dei requisiti	2
3	Consuntivazione	2
3.1	Milestones:	2
3.2	Attività svolte	2
3.3	Difficoltà e problemi di sprint	3

1 Ruoli

I ruoli in questo sprint sono cambiati rispetto allo sprint precedente, come da verbale VIN_20221122_1.

I ruoli principali:

Nominativo	Ruolo
Bonavigo Michele	Verificatore
Casarotto Mattia	Responsabile
Massarenti Alessandro	Analista
Peron Samuel	Analista
Pierobon Luca	Amministratore
Romano Davide	Analista
Zarantonello Giorgio	Analista

2 Preventivo

In questo sprint abbiamo preventivato di completare una prima versione dell'analisi dei requisiti, rudimentale ma per lo più completa.

2.1 Milestones:

2.1.1 Release versione 0.0.3 dell'analisi dei requisiti

È la principale milestone di questo sprint.

Questa milestone è registrata qui

3 Consuntivazione

3.1 Milestones:

- Release versione 0.0.3 dell'analisi dei requisiti (Completa al: 100%)


3.2 Attività svolte

Attività	Stato	Ruolo
prima stesura del glossario dei termini	completato	Analista
prima bozza vincoli di progettazione	completato	Analista
prima bozza obiettivi di prodotto	completato	Analista
prima bozza caratteristiche degli utenti	completato	Analista
prima bozza caratteristiche del prodotto	completato	Analista
prima bozza descrizione attori	completato	Analista
aggiornato registro modifiche per il rilascio	completato	Analista e Verificatore

Tabella 1: Lista delle attività svolte durante lo sprint

	Re	Amm	An	Pro	Prog	Ver	tot
Bonavigo Michele	0	0	0	0	0	2,9	2,9
Casarotto Mattia	3,5	0	0	0	0	0	3,5
Massarenti Alessandro	0	0	2,4	0	0	1,2	3,6
Peron Samuel	0	0	2,5	0	0	0	2,5
Pierobon Luca	0	5	0	0	0	0,1	5,1
Romano Davide	0	0	3,1	0	0	0	3,1
Zarantonello Giorgio	0	0	2,5	0	0	0	2,5
	3,5	5	10,5	0	0	4,2	

Tabella 2: Spartizione dei ruoli e ore svolte durante lo sprint

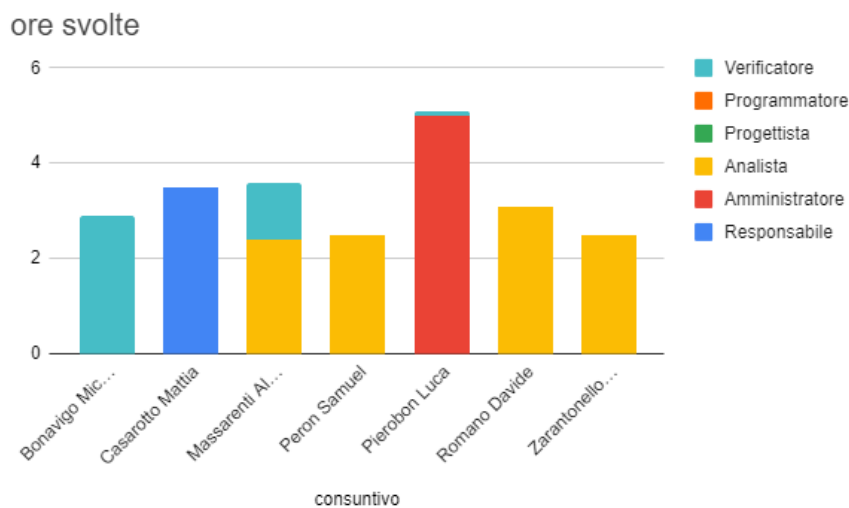

	Ore	Costo
Responsabile	3,5	€ 105,00
Amministratore	5	€ 100,00
Analista	10,5	€ 262,50
Progettista	0	€ 0,00
Programmatore	0	€ 0,00
Verificatore	4,2	€ 63,00
totale	23,2	€ 530,50

Tabella 3: Spartizione dei ruoli e ore svolte durante lo sprint

Avendo quindi consumato €530,50¹ del budget durante questo sprint, rimangono ancora a disposizione € 13002,75 per gli sprint seguenti.

3.3 Difficoltà e problemi di sprint

Alcune questioni sono risultate durante questo sprint:

- Comprendere a fondo i bisogni del capitolato.

Queste verranno discusse in sede di preparazione del prossimo sprint.

¹Si veda tabella 3
