



Università di Padova



sweasabi@gmail.com

Corso di Ingegneria del Software A.A.:2022/2023

Verbale *Sprint 4*

dal 4 dic 2022 al 17 dic 2022

Approvazione	Casarotto Mattia
Segreteria	Casarotto Mattia Bonavigo Michele
Verifica	Massarenti Alessandro
Uso	Interno Esterno
Destinatario	<i>Il gruppo</i> Committente

Indice

1	Ruoli	2
2	Preventivo	2
2.1	Milestones:	2
2.1.1	Release versione 0.0.4 dell'analisi dei requisiti	2
3	Consuntivazione	2
3.1	Milestones:	2
3.2	Attività svolte	2
3.3	Difficoltà e problemi di sprint	3

1 Ruoli

I ruoli in questo sprint sono rimasti gli stessi dello sprint precedente, vedasi verbale SPR_20221120.

I ruoli principali:

Nominativo	Ruolo
Bonavigo Michele	Verificatore
Casarotto Mattia	Responsabile
Massarenti Alessandro	Analista
Peron Samuel	Analista
Pierobon Luca	Amministratore
Romano Davide	Analista
Zarantonello Giorgio	Analista

2 Preventivo

In questo sprint abbiamo preventivato di sistemare le questioni di workflow amministrativo, andare avanti con l'analisi dei requisiti e in particolare con i casi d'uso.

2.1 Milestones:

2.1.1 Release versione 0.0.4 dell'analisi dei requisiti

È la principale milestone di questo sprint.

Questa milestone è registrata qui

3 Consuntivazione

3.1 Milestones:

- Release versione 0.0.4 dell'analisi dei requisiti (Completa al: 75%)


3.2 Attività svolte

Attività	Stato	Ruolo
creazione e manutenzione workflow amministrativi	completato	Amministratore
confronto con proponente	completato	Analista
confronto con committente	completato	Analista

Tabella 1: Lista delle attività svolte durante lo sprint

	Re	Amm	An	Pro	Prog	Ver	tot
Bonavigo Michele	0	0	0	0	0	1,35	1,35
Casarotto Mattia	3,9	0	0	0	0	0	3,9
Massarenti Alessandro	0	0	1,3	0	0	0,5	1,8
Peron Samuel	0	0	0	0	0	0	0
Pierobon Luca	0	2,25	0	0	0	0	2,25
Romano Davide	0	0	0	0	0	0	0
Zarantonello Giorgio	0	0	0	0	0	0	0
	3,9	2,25	1,3	0	0	1,85	

Tabella 2: Spartizione dei ruoli e ore svolte durante lo sprint

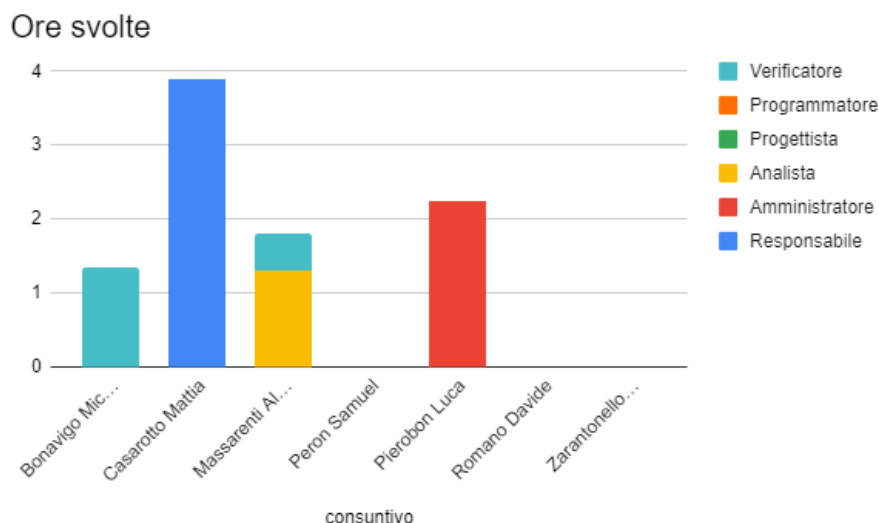

	Ore	Costo
Responsabile	3,9	€ 117,00
Amministratore	2,25	€ 45,00
Analista	1,3	€ 32,50
Progettista	0	€ 0,00
Programmatore	0	€ 0,00
Verificatore	1,85	€ 27,75
totale	9,3	€ 222,25

Tabella 3: Spartizione dei ruoli e ore svolte durante lo sprint

Avendo quindi consumato €222,25¹ del budget durante questo sprint, rimangono ancora a disposizione € 12780,50 per gli sprint seguenti.

3.3 Difficoltà e problemi di sprint

Alcune questioni sono risultate durante questo sprint:

- Conciliare impegni personali per incontri.

Queste verranno discusse in sede di preparazione del prossimo sprint.

¹Si veda tabella 3
