



Università di Padova



sweasabi@gmail.com

Corso di Ingegneria del Software A.A.:2022/2023

Verbale *Sprint 10*

dal 26 feb 2023 al 11 mar 2023

Approvazione	Massarenti Alessandro
Segreteria	Bonavigo Michele Casarotto Mattia
Verifica	Pierobon Luca
Uso	Interno Esterno
Destinatario	<i>Il gruppo</i> Committente

Indice

1	Ruoli	2
2	Preventivo	2
2.1	Milestones:	2
2.1.1	Release versione 0.0.5 dell'analisi dei requisiti	2
3	Consuntivazione	2
3.1	Milestones:	2
3.2	Attività svolte	2
3.3	Trend e riflessioni	4
3.4	Difficoltà e problemi di sprint	4

1 Ruoli

I ruoli in questo sprint sono rimasti gli stessi dello sprint precedente¹.

I ruoli principali:

Nominativo	Ruolo
Bonavigo Michele	Analista
Casarotto Mattia	Analista
Massarenti Alessandro	Responsabile
Peron Samuel	Analista
Pierobon Luca	Verificatore
Romano Davide	Analista
Zarantonello Giorgio	Analista

2 Preventivo

In questo sprint abbiamo preventivato di continuare la stesura della documentazione richiesta per soddisfare le aspettative in ingresso alla revisione **RTB**.

2.1 Milestones:

2.1.1 Release versione 0.0.5 dell'analisi dei requisiti

È la principale milestone di questo sprint.

L'obiettivo è di rilasciare questa versione al termine di questo sprint, in previsione della versione 0.1 che sarà la prima versione completa, ma non finalizzata.

Questa milestone è registrata qui.

3 Consuntivazione

3.1 Milestones:

- Release versione 0.0.5 dell'analisi dei requisiti (Completa al: 100%)

3.2 Attività svolte


Attività	Stato	Ruolo
stesura e formalizzazione dei requisiti	completato	Analista
rilasciata versione 0.0.5 dell'analisi dei requisiti	completato	Responsabile
Riorganizzazione del PoC relativamente a requisiti e scelta proponente	completato	Analista
stesura del piano di qualifica	parziale	Analista

Tabella 1: Lista delle attività svolte durante lo sprint

¹definiti nel verbale VIN_20230114

	Re	Amm	An	Pro	Prog	Ver	tot
Bonavigo Michele	0,2	0,6	2,1	0	0	2,2	5,1
Casarotto Mattia	0	0	7,9	0,5	0	0,1	8,5
Massarenti Alessandro	3,7	0	0,8	0	0	3,2	7,7
Peron Samuel	0	0,3	7,25	7	0	0	14,55
Pierobon Luca	0	0	0,5	0	0	4,45	4,95
Romano Davide	0	0	5,75	7	0	0	12,75
Zarantonello Giorgio	0	0,1	4,25	1,5	0	0	5,85
	3,9	1	28,55	16	0	9,95	

Tabella 2: Spartizione dei ruoli e ore svolte durante lo sprint

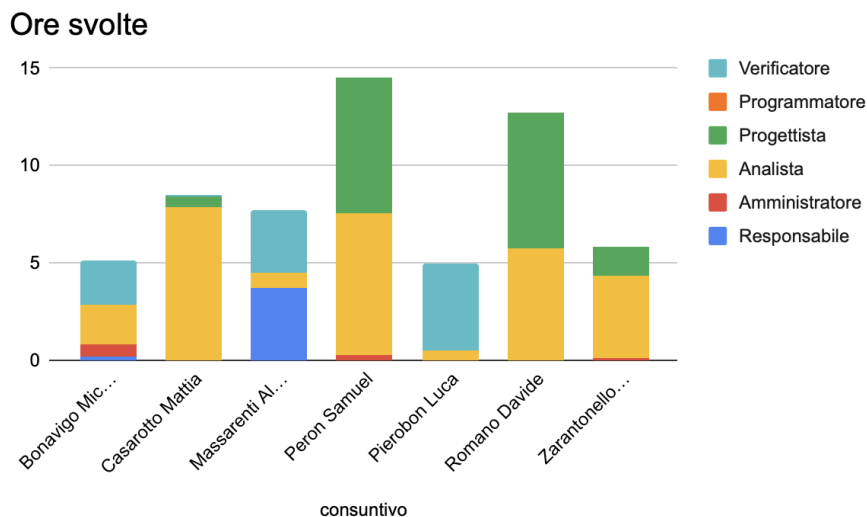

	Ore	Costo
Responsabile	3,9	€ 117,00
Amministratore	1	€ 20,00
Analista	28,55	€ 713,75
Progettista	16	€ 400,00
Programmatore	0	€ 0,00
Verificatore	9,95	€ 149,25
totale	59,4	€ 1400,00

Tabella 3: Spartizione dei ruoli e ore svolte durante lo sprint

Avendo quindi consumato €1400,00² del budget durante questo sprint, rimangono ancora a disposizione € 9906,50 per gli sprint seguenti.

²Si veda tabella 3

3.3 Trend e riflessioni

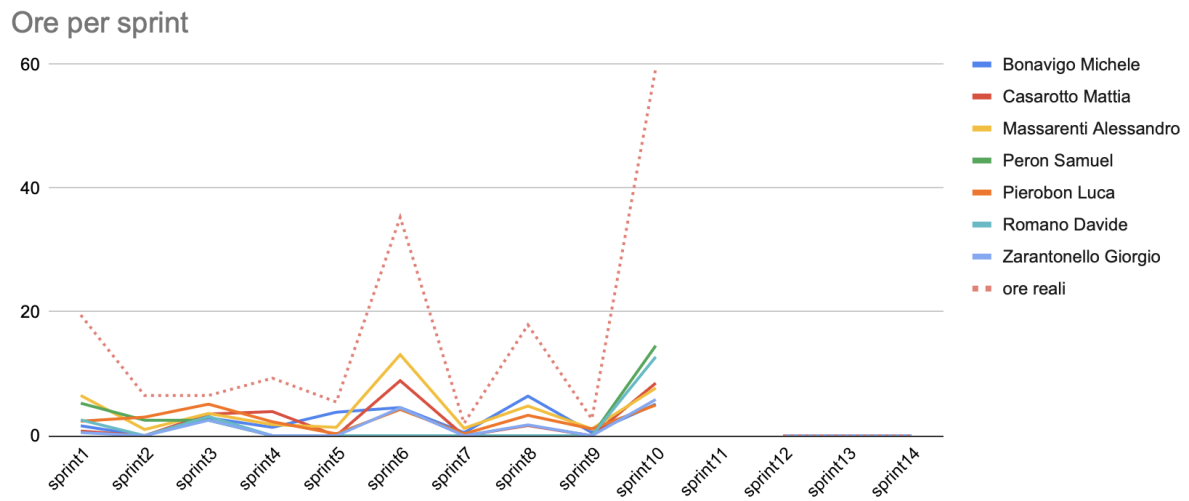


Figura 1: Andamento ore utilizzate nei vari sprint

Durante questo sprint si è assistito ad una ripresa delle attività dopo il rallentamento dettato dal momento *clou* della sessione di esami. Tuttavia è stata riscontrata una collaborazione non uniforme da parte di tutti i membri del gruppo.

3.4 Difficoltà e problemi di sprint

Non ci sono state grandi difficoltà esterne durante questo sprint. Purtroppo però, come negli sprint appena precedenti, non siamo ancora riusciti a definire con il proponente il supporto hardware per i lampioni a cui dovremo fare fede.

Internamente, come difficoltà, si rimanda alla riflessione posta nella sezione 3.3.

Queste verranno discusse in sede di preparazione del prossimo sprint.
